



CNPJ 07.569.949/0001-56  
Itaúba Construtora Ltda. ME

À  
Prefeitura Municipal de Bom jardim

**Ref.:** Processo Administrativo nº 0376/2024 - Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, em 20/05/2024 - Contrato PMB nº 029/2024, firmado em 14 de junho de 2024.

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, localizada na Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Solicito a Prefeitura Municipal de Bom jardim, na pessoa de seu Secretário, que determine a **2ª MEDIÇÃO** das obras e serviços de engenharia para construção de rede de drenagem pluvial, localizada na Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ, referente às obras executadas conforme planilhas em anexo.

Cordeiro, RJ, 29 de julho de 2024.

  
**ITAUBA CONSTRUTORA LTDA-ME.**  
José Carlos Gonçalves Guzzo  
RG - 006.878.235-8 - DETRAN-RJ  
CPF - 821.978.817-87  
Sócio Administrador  
**[07.569.949/0001-56]**  
**Itauba Construtora Ltda.-ME**  
Rua Manoel Guzzo, 41  
Sena Campos - CEP 28540-000  
Cordeiro - RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	
NUMERO	5302
ENT	29 DE 07 DE 24
Somyres	
PROTÓTIPO	



Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**  
 Secretaria Municipal de Projetos

**MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ**

Contrato PMB nº 029/2024 - 14/06/2024

Prazo Inicial: 12 (doze) meses - Data de Início: 14/06/2024 - Data de Término: 13/06/2025

Prorrogações:

Processo Administrativo nº 0376/2024

Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024 - 20/05/2024

Contratada: Itauba Construtora Ltda. ME

CNPJ: 07.569.949/0001-56

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordero, RJ, CEP 28.540-000.

Obra: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Local: Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

Serviços Executados - Período de Medição: 29/06/2024 à 28/07/2024

**ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO**

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS		
					UNITARIO	BDI	UNITARIO (COM BDI) TOTAL

**1.0 - CANTEIRO DE OBRAS**

1.0.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,60	R\$ 800,00	26,85%	R\$ 1.014,80	R\$ 12.786,48
1.0.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N 22', ADESVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	R\$ 179,25	26,85%	R\$ 227,38	R\$ 1.364,28
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 14.150,76</b>

**2.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

2.0.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.023,75	R\$ 11,00	26,85%	R\$ 13,95	R\$ 14.281,31
2.0.2	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADERA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO, 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	455,00	R\$ 14,95	26,85%	R\$ 18,96	R\$ 8.626,80
2.0.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.730,00	R\$ 2,15	26,85%	R\$ 2,73	R\$ 7.452,90
<b>TOTAL DO ITEM</b>								<b>R\$ 30.361,01</b>

DATA MEDIÇÃO: 29/07/2024

**ELEMENTOS DA MEDIÇÃO**

MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)	Desvio (%)
-------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------

0,00	12,60	R\$ -	R\$ 12.786,48	100,00%
0,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.364,28	100,00%
		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 14.150,76</b>	100,00%

300,00	200,00	R\$ 4.185,00	R\$ 3.792,00	43,96%
150,00	910,00	R\$ 2.844,00	R\$ 2.484,30	33,33%
910,00		<b>R\$ 9.513,30</b>	<b>R\$ 12.030,68</b>	39,63%

**07.569.949/0001-56**

**Itauba Construtora Ltda.-ME**

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000





Estado do Rio de Janeiro  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**  
 Secretaria Municipal de Projetos

<b>MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ</b>		Contrato PMB nº 029/2024 - 14/06/2024	
Prazo Inicial: 12 (doze) meses - Data de Início: 14/06/2024 - Data de Término: 13/06/2025		Prorrogações:	
Processo Administrativo nº 0376/2024		Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024 - 20/05/2024	
Contratada: Itauba Construtora Ltda. ME		CNPJ: 07.569.949/0001-56	
Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro, RJ, CEP 28.540-000.			

Obra: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL  
 Local: Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

**RELATÓRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO**

**2ª Medição**

Serviços Executados - Período de Medição: 29/06/2024 à 28/07/2024 DATA MEDIÇÃO: 29/07/2024

**ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO**

**ELEMENTOS DA MEDIÇÃO**

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	QUANT.	Unid.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
<b>1.0 - CANTEIRO DE OBRAS</b>						
1.0.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	12,60	M2		
		QUANTIDADE	Área			
		3,00	4,20		12,60	0,00
1.0.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	6,00	M2		
		QUANTIDADE	Mês			
		3,00	2,00		6,00	0,00
<b>2.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						
2.0.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.023,75	M3		
		COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	LARGURA		
		455,00	1,50	1,50	1.023,75	300,00
2.0.2	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	455,00	M3		
		COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	LARGURA		
		455,00	1,00	1,00	455,00	150,00
2.0.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.730,00	M2		
		COMPRIMENTO	LARGURA			
		455,00	6,00		2.730,00	910,00
<b>3.0 - DRENAGEM</b>						
3.0.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	455,00	M		
		COMPRIMENTO				
		455,00			455,00	180,00
3.0.2	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	12,00	UN		
		QUANTIDADE				
		12,00			12,00	5,00
3.0.3	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	12,00	UN		
		QUANTIDADE				
		12,00			12,00	0,00
3.0.4	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	12,00	UN		
		QUANTIDADE				
		12,00			12,00	0,00
3.0.5	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2021	12,00	UN		
		QUANTIDADE				
		12,00			12,00	0,00
<b>4.0 - CONTAINER</b>						
4.0.1	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS		
		QUANTIDADE				
		6,00			6,00	1,00

Bom Jardim, RJ, 29 de julho de 2024.

CONTRATADA/CONSTRUTORA

FISCAL/NOME/MATRICULA

VISTO/SECRETÁRIO

**07.569.949/0001-56**

**Itauba Construtora Ltda.-ME**

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

2ª Medição

**Obra:** SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-RJ.

**Local:** Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Processo Administrativo nº 0376/2024.

Procedimento Licitatório Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, realizado em 20 de maio de 2024.

Contrato PMB nº 029/2024, firmado em 14 de junho de 2024.

Prazo Inicial: 12 (doze) meses.

Data de Início: 14 de junho de 2024.

Data de Término: 13 de junho de 2025.

Contratada: Itaúba Construtora Ltda. ME

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro.


CNPJ: 07.569.949/0001-56



JUNHO 2024





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

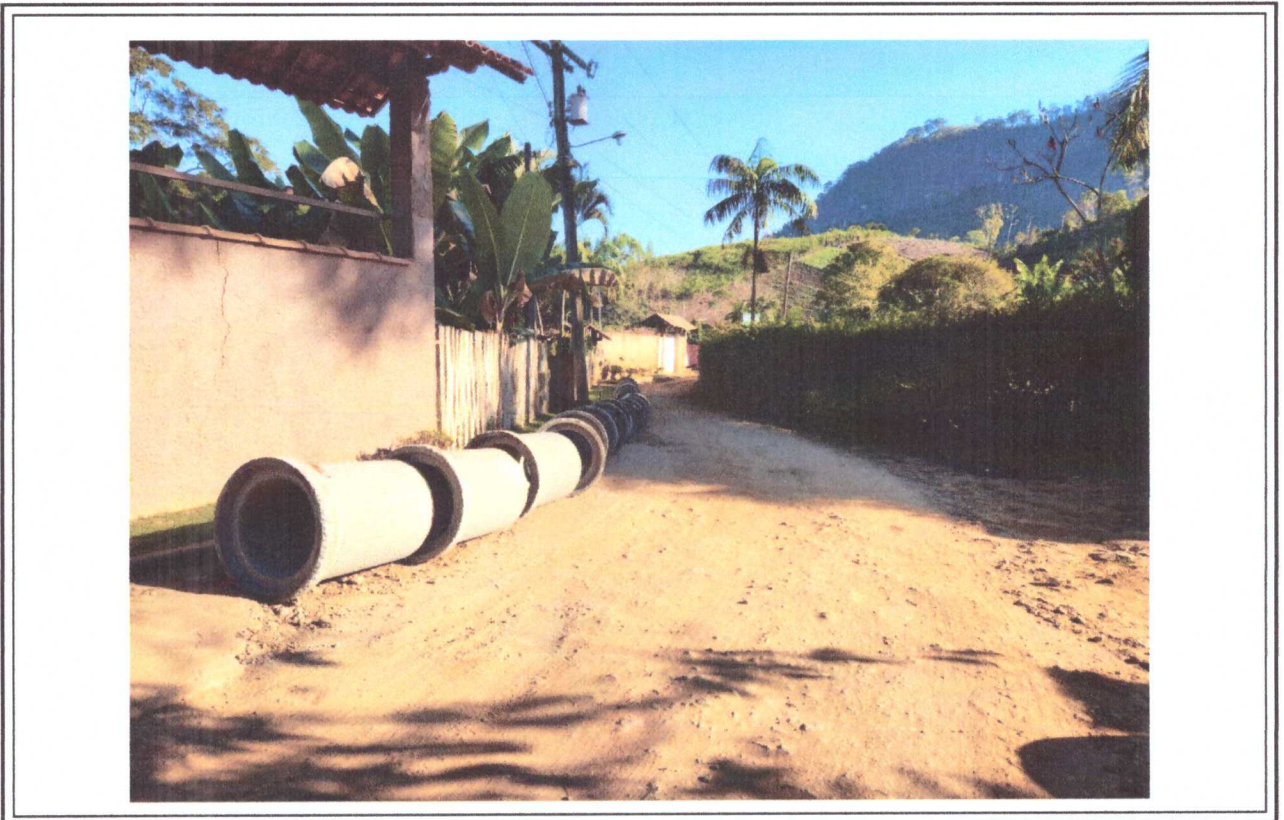



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

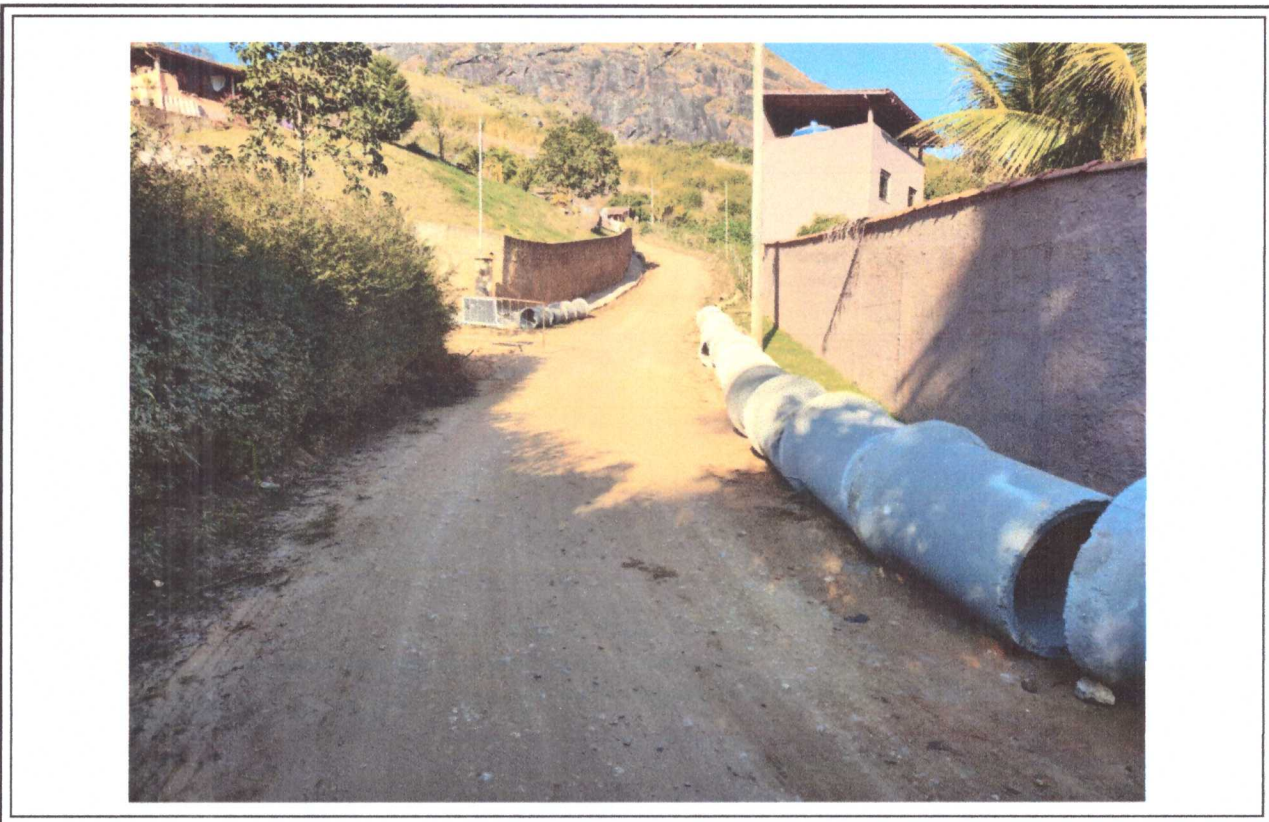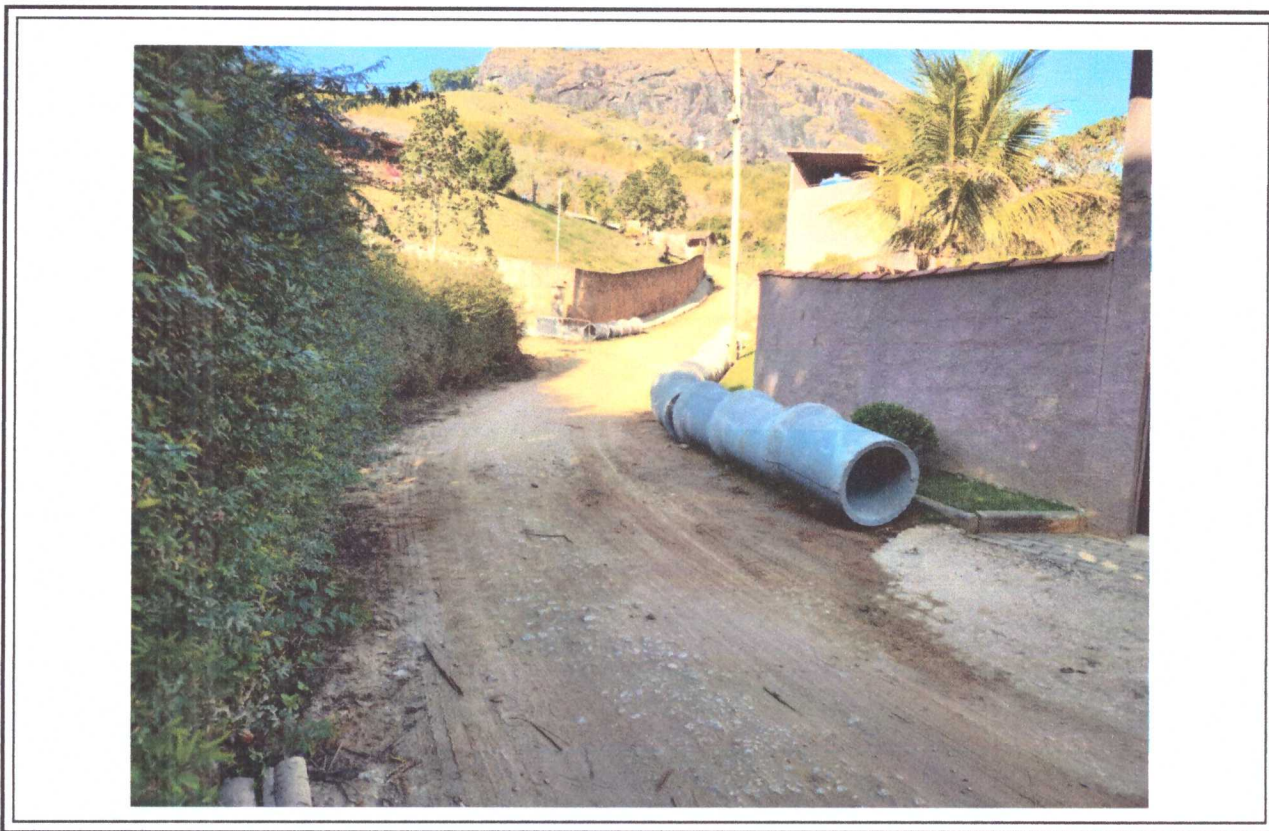



Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM







Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM






Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

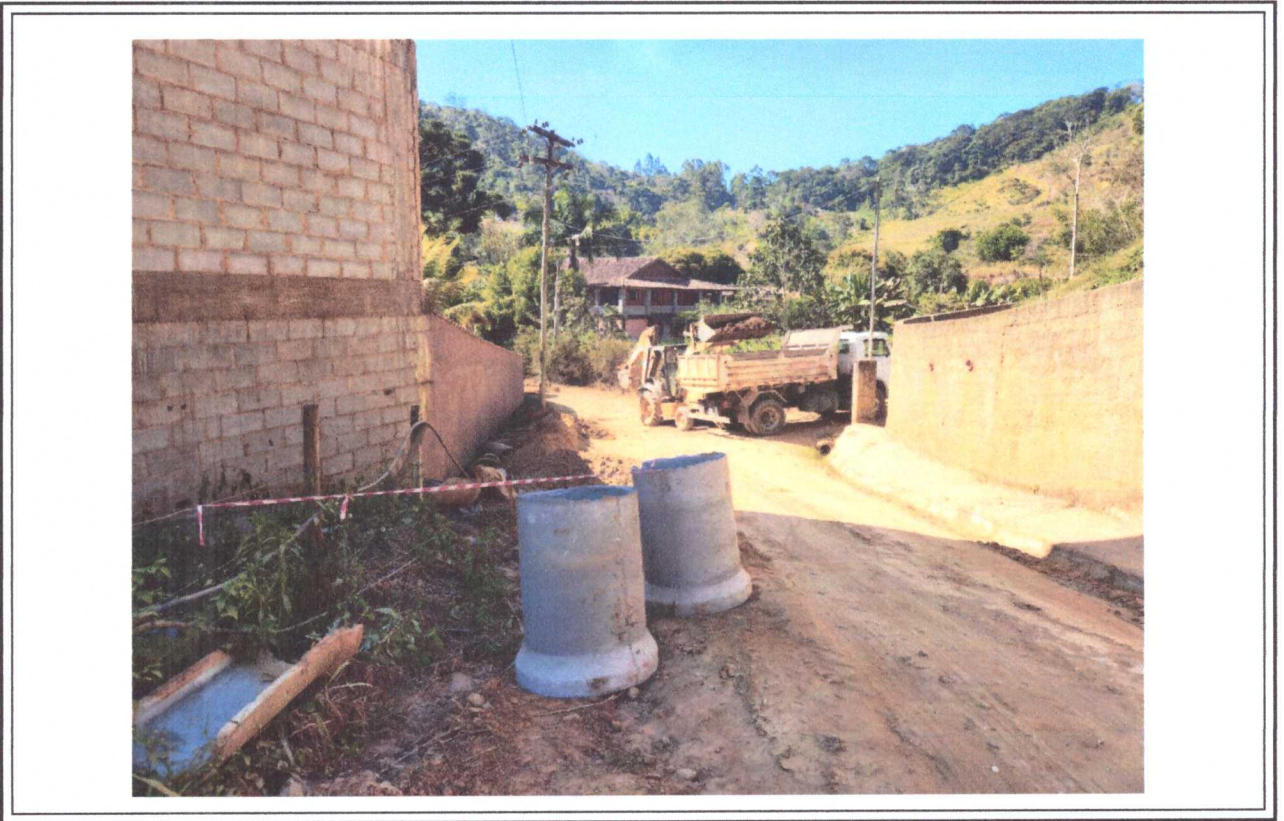





Estado do Rio de Janeiro  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



Bom Jardim, RJ, 29 de julho de 2024.
