

À
Prefeitura Municipal de Bom jardim

Ref.: Processo Administrativo nº 0376/2024 - Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, em 20/05/2024 - Contrato PMB nº 029/2024, firmado em 14 de junho de 2024.

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, localizada na Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Solicito a Prefeitura Municipal de Bom jardim, na pessoa de seu Secretário, que determine a 3ª **MEDIÇÃO Final** das obras e serviços de engenharia para construção de rede de drenagem pluvial, localizada na Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ, referente às obras executadas conforme planilhas em anexo.

Cordeiro, RJ, 28 de agosto de 2024.



ITAÚBA CONSTRUTORA LTDA-ME.

José Carlos Gonçalves Guzzo
RG - 006.878.235-8 - DETRAN-RJ
CPF - 821.978.817-87
Sócio Administrador

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41
Sena Campos - CEP 28540-000
Cordeiro - RJ





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
 Secretaria Municipal de Projetos

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ

Contrato PMB nº 029/2024 - 14/06/2024

Prazo Inicial: 12 (doze) meses - Data de Início: 14/06/2024 - Data de Término: 13/06/2025

Prorrogações:

Processo Administrativo nº 0376/2024

Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024 - 20/05/2024

Contratada: Itauba Construtora Ltda. - ME

CNPJ: 07.569.949/0001-56

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro, RJ, CEP 28.540-000.

Obra: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Local: Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Serviços Executados - Período de Medição: 29/07/2024 à 28/08/2024

3ª Medição Final

DATA MEDIÇÃO: 28/08/2024

ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRICAO	UNID.	QUANT.	PREÇOS			TOTAL
					UNITARIO	BDI	UNITARIO (COM BDI)	
1.0 - CANTEIRO DE OBRAS								
1.0.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016	M2	12,60	R\$ 800,00	26,85%	R\$ 1.014,80	R\$ 12.786,48
1.0.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE "2 X 1,2" M. (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,00	R\$ 179,25	26,85%	R\$ 227,38	R\$ 1.364,28
					TOTAL DO ITEM			R\$ 14.150,76

2.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.0.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3). LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1.023,75	R\$ 11,00	26,85%	R\$ 13,95	R\$ 14.281,31
2.0.2	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ POTÊNCIA: 88 HP). LARGURA 0,8 X 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	455,00	R\$ 14,95	26,85%	R\$ 18,96	R\$ 8.626,80
2.0.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	2.730,00	R\$ 2,15	26,85%	R\$ 2,73	R\$ 7.452,90
					TOTAL DO ITEM			R\$ 30.361,01

MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)	Desvio (%)
0,00	12,60	R\$ -	R\$ 12.786,48	100,00%
0,00	6,00	R\$ -	R\$ 1.364,28	100,00%
		R\$ 0,00	R\$ 14.150,76	100,00%

MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO (R\$)	Desvio (%)
611,25	1.023,75	R\$ 8.526,93	R\$ 14.281,31	100,00%
255,00	455,00	R\$ 4.834,80	R\$ 8.626,80	100,00%
1.820,00	2.730,00	R\$ 4.968,60	R\$ 7.452,90	100,00%
		R\$ 18.330,33	R\$ 30.361,01	100,00%

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

3.0 - DRENAGEM									
3.0.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	455,00	R\$ 290,30	26,85%	R\$ 368,25	R\$ 167.553,75	100,00%
3.0.2	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	12,00	R\$ 3.778,10	26,85%	R\$ 4.792,52	R\$ 57.510,24	100,00%
3.0.3	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	12,00	R\$ 530,10	26,85%	R\$ 672,43	R\$ 8.069,16	100,00%
3.0.4	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1,1 M. AF_12/2020	UN	12,00	R\$ 1.486,10	26,85%	R\$ 1.885,12	R\$ 22.621,44	100,00%
3.0.5	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO : AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12,00	R\$ 322,50	26,85%	R\$ 409,09	R\$ 4.909,08	100,00%
TOTAL DO ITEM								R\$ 260.663,67	

4.0 - CONTAINER									
4.0.1	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	6,00	R\$ 1.210,00	26,85%	R\$ 1.534,89	R\$ 9.209,34	100,00%
TOTAL DO ITEM								R\$ 9.209,34	
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 314.384,78	

Valor Contratado para a Obra	R\$ 314.384,78
Valor da Medição	R\$ 181.997,21
Valor da Medição acumulada	R\$ 314.384,78
Saldo do Valor Contratado para a Obra	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$ 181.997,21

455,00	R\$ 88.380,00	R\$ 167.553,75	100,00%
240,00			
12,00		R\$ 57.510,24	100,00%
7,00	R\$ 33.547,64		
12,00	R\$ 8.069,16	R\$ 8.069,16	100,00%
12,00	R\$ 22.621,44	R\$ 22.621,44	100,00%
12,00	R\$ 4.909,08	R\$ 4.909,08	100,00%
	R\$ 157.527,32	R\$ 260.663,67	100,00%

6,00	R\$ 9.209,34	100,00%	
4,00	R\$ 6.139,56		
	R\$ 6.139,56	R\$ 9.209,34	100,00%
	R\$ 161.997,21	R\$ 314.384,78	100,00%

0,00000%
57,89000%
100,00000%
0,00000%
57,89000%

Bom Jardim, RJ, 28 de agosto de 2024.

CONTRATADA/CONSTRUTORA

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ

FISCAL/NOME/MATRÍCULA

VISTO/SECRETÁRIO



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
 Secretaria Municipal de Projetos

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - RJ		Contrato PMB nº 029/2024 - 14/06/2024	
Prazo Inicial: 12 (doze) meses - Data de Início: 14/06/2024 - Data de Término: 13/06/2025		Prorrogações:	
Processo Administrativo nº 0376/2024		Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024 - 20/05/2024	
Contratada: Itauba Construtora Ltda. ME		CNPJ: 07.569.949/0001-56	
Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro, RJ CEP 28.540-000.			

Obra: CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
 Local: Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

RELATÓRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MEDIÇÃO

3ª Medição Final

Serviços Executados - Período de Medição: 29/07/2024 a 28/08/2024 DATA MEDIÇÃO: 28/08/2024

ELEMENTOS RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO

ELEMENTOS DA MEDIÇÃO

ITEM	CODIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	QUANT.	Unid.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO*
1.0 - CANTEIRO DE OBRAS						
1.0.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	12,60	M2	0,00	12,60
		QUANTIDADE	Área			
			3,00	4,20		
						12,60
1.0.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	6,00	M2	0,00	6,00
		QUANTIDADE	Mês			
			3,00	2,00		
						6,00
2.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
2.0.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	1.023,75	M3	611,25	1.023,75
		COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	LARGURA		
			455,00	1,50		
						1.023,75
2.0.2	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	455,00	M3	255,00	455,00
		COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	LARGURA		
			455,00	1,00		
						455,00
2.0.3	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.730,00	M2	1.820,00	2.730,00
		COMPRIMENTO	LARGURA			
			455,00	6,00		
						2.730,00
3.0 - DRENAGEM						
3.0.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	455,00	M	240,00	455,00
		COMPRIMENTO				
			455,00			
						455,00
3.0.2	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	12,00	UN	7,00	12,00
		QUANTIDADE				
			12,00			
						12,00
3.0.3	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	12,00	UN	12,00	12,00
		QUANTIDADE				
			12,00			
						12,00
3.0.4	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,5X1X1 M. AF_12/2020	12,00	UN	12,00	12,00
		QUANTIDADE				
			12,00			
						12,00
3.0.5	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO : AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	12,00	UN	12,00	12,00
		QUANTIDADE				
			12,00			
						12,00
4.0 - CONTAINER						
4.0.1	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	6,00	MÊS	4,00	6,00
		QUANTIDADE				
			6,00			
						6,00

Bom Jardim, RJ, 28 de agosto de 2024.

CONTRATADA/CONSTRUTORA

FISCAL/NOME/MATRICULA

VISTO/SECRETÁRIO

07.569.949/0001-56

Itauba Construtora Ltda.-ME

Rua Manoel Guzzo, 41

Sena Campos - CEP 28540-000

Cordeiro - RJ



MEMÓRIA FOTOGRÁFICA

3ª Medição Final

Obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-RJ.

Local: Comunidade denominada Retiro, Banquete, 3º Distrito do Município de Bom Jardim, RJ.

Processo Administrativo nº 0376/2024.

Procedimento Licitatório Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, realizado em 20 de maio de 2024.

Contrato PMB nº 029/2024, firmado em 14 de junho de 2024.

Prazo Inicial: 12 (doze) meses.

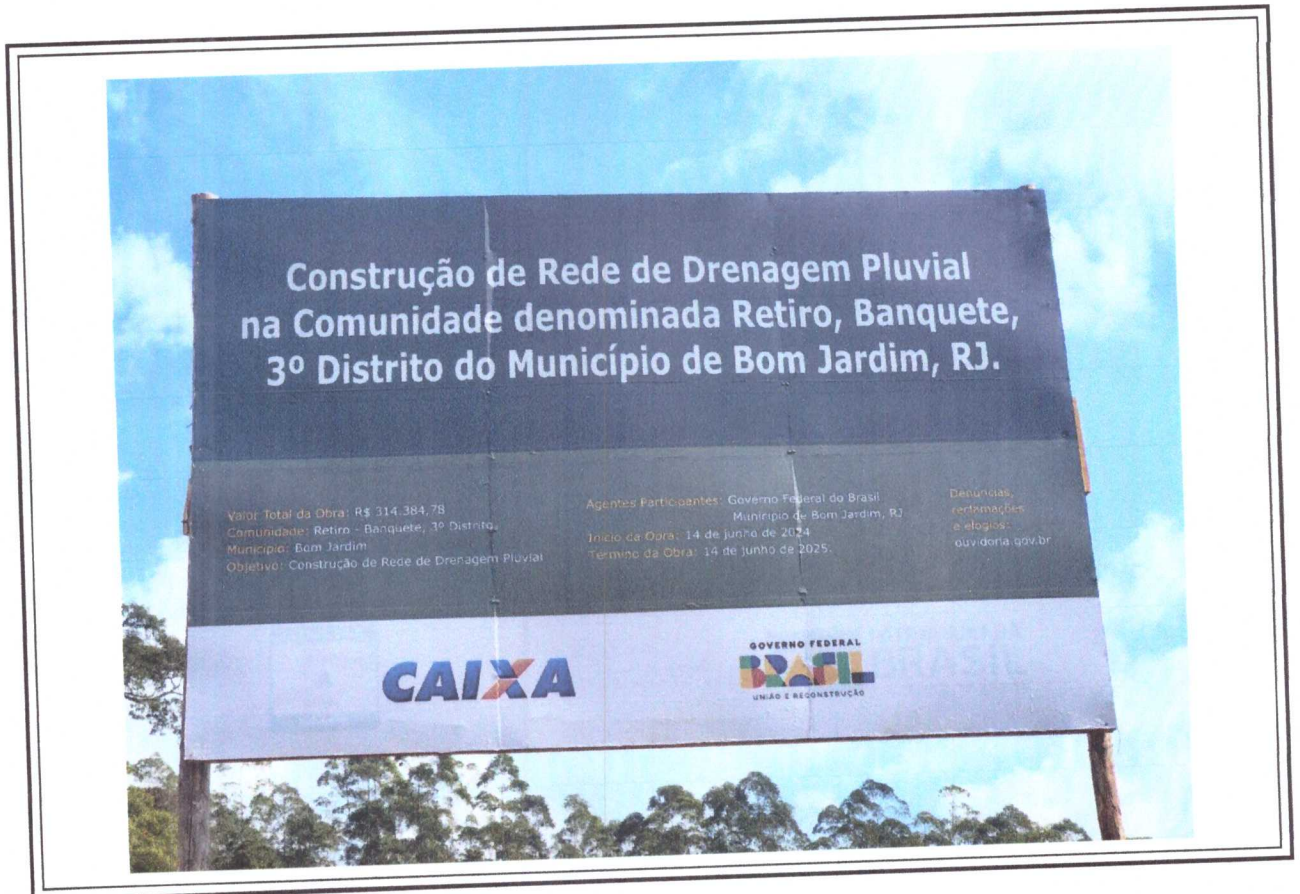
Data de Início: 14 de junho de 2024.

Data de Término: 13 de junho de 2025.

Contratada: Itaúba Construtora Ltda. ME

Endereço: Rua Manoel Guzzo, 41, Bairro Senna Campos, Primeiro Distrito do Município de Cordeiro.

CNPJ: 07.569.949/0001-56



JUNHO 2024



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM





Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



Bom Jardim, RJ, 28 de agosto de 2024.
